




REPUBLIQUE DU NIGER

Fraternité-Travail-Progrès

MINISTRE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT

DIRECTION GENERALE DE L'ASSAINISSEMENT

FEUILLE DE ROUTE POUR UN NIGER SANS DEFECATION A L'AIR LIBRE

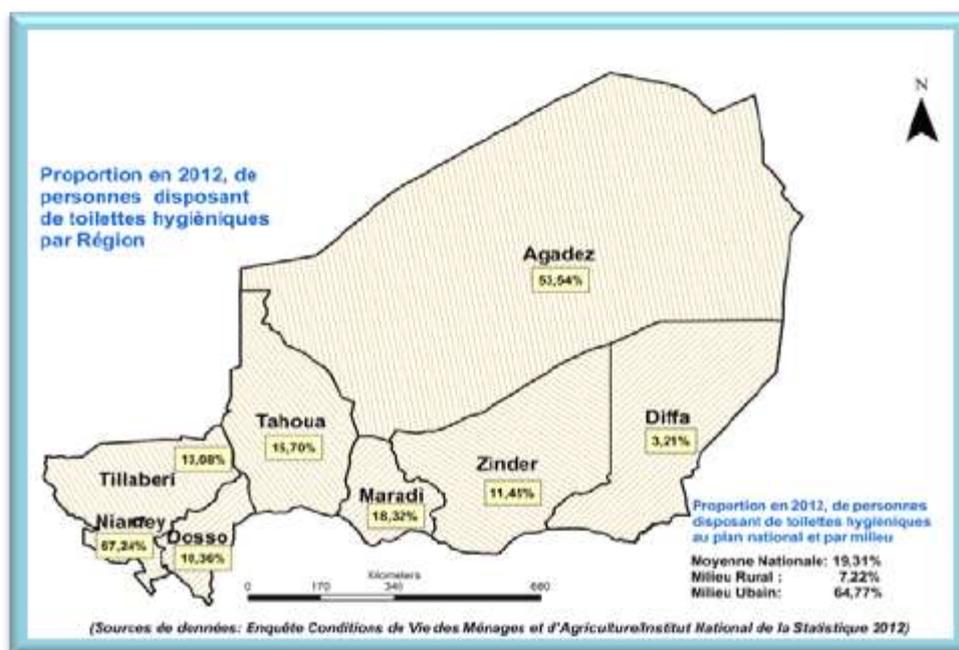

VERSION FINALE

Novembre 2017

Table des matières

I. Contexte	3
II. Processus d'élaboration de la Feuille de Route	4
III. Objectifs de la feuille de route	5
III.1.Objectif général.....	5
III.2.Objectifs spécifiques	5
IV. Axes de la Feuille de Route	6
IV.1 Politique et stratégie.....	6
IV.2 Coordination des acteurs	6
IV.3 Communication et plaidoyer.....	7
IV.4 Renforcement des capacités.....	7
IV.5 Ingénierie sociale et infrastructures.....	7
IV.6 Suivi Post FDAL.....	8
IV.7 Mobilisation des ressources	8
V. Acteurs de mise en œuvre de la feuille de route, rôles et responsabilités	8
V.1 Acteurs de mise en œuvre	8
V.2 Rôles et responsabilités des acteurs	9
VI. Plan d'actions national pour un Niger sans défécation à l'air libre	10
VI.1 Synthèse du plan d'actions du niveau central.....	11
VI.2 Synthèse du plan d'actions des régions.....	12
VI.3 Synthèse Plan d'actions national (synthèse des plans d'actions du niveau central et des régions) par axe de la feuille de route	13
ANNEXES	14
Annexe 1. Plan d'actions détaillé du Niveau Central par axe stratégique.....	15
Annexe 2: Plan d'actions détaillé des Régions par axe stratégique	23

I. Contexte

Selon l'Institut National de la Statistique (INS/ECVMA), le taux d'accès aux latrines hygiéniques était de 5,1% en milieu rural et 73,5% en milieu urbain en 2014. Toujours selon l'INS/enquête ENISED 2015, 68,7% des ménages pratiquent la défécation à l'air libre. Toutefois, le JMP indique en 2015 un taux de défécation à l'air libre de 73%. L'un dans l'autre, c'est environ 14,5 millions de personnes qui sont concernées, ce qui classe le Niger au 6^{ème} rang mondial des pays pratiquant la défécation à l'air libre. D'une manière générale les mauvaises conditions d'hygiène et d'assainissement associées à la pratique de la défécation à l'air libre engendrent des conséquences sur la santé des populations mais également ont des impacts négatifs sur l'économie. En effet, le Niger perd annuellement environ 75 milliards de FCFA, selon une étude du Programme Eau et Assainissement (WSP) de la Banque Mondiale sur les impacts économiques d'un mauvais assainissement en Afrique de Mars 2012.

Avec l'arrivée à terme des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) en Décembre 2015, que le Niger comme d'autres pays, n'a pas pu atteindre dans le sous-secteur de l'assainissement, la Communauté Internationale, sous l'égide des Nations Unies, a défini de nouveaux objectifs appelés «Objectifs de Développement Durable (ODD)» pour la période Post 2015. L'objectif 6 des ODD relatif au secteur de l'eau et de l'assainissement consiste à garantir l'accès de tous à des services d'approvisionnement en eau et d'assainissement et à assurer une gestion durable des ressources en eau d'ici 2030.

Aussi, le Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a élaboré le document du «Programme Sectoriel Eau, Hygiène et Assainissement (PROSEHA)» pour la période 2016-2030 aligné aux ODD. Le PROSEHA comporte cinq (5) Sous-programmes dont celui portant sur l'Hygiène et l'Assainissement. En conformité avec la cible 6.2, l'objectif global de ce sous-programme est «d'assurer à l'horizon 2030, l'accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d'Assainissement et d'Hygiène adéquats, de mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable, et de réduire de moitié la proportion d'eaux usées non traitées».

Ainsi, au titre des défis à relever pour atteindre les objectifs du sous-programme Assainissement du PROSEHA, existe celui lié à l'arrêt de la défécation à l'air libre au Niger à l'horizon 2030. A cet effet, des actions doivent être menées pour la certification FDAL de plus de 30 000 villages.

Améliorer significativement l'accès des populations aux services d'assainissement requiert un changement positif de comportements pour mettre fin à la défécation à l'air libre et adopter les bonnes pratiques d'hygiène conformément aux axes stratégiques de la Stratégie Opérationnelle de Promotion de l'Hygiène et de l'Assainissement de Base (SOPHAB). Ainsi, pour obtenir des changements rapides, durables et à moindre coût, le Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a opté pour que l'approche «Assainissement Total Piloté par la Communauté» (ATPC) soit la porte d'entrée pour la mise en œuvre de la SOPHAB.

La mise à l'échelle de l'approche ATPC demeure toutefois timide et cela à cause du nombre encore limité d'acteurs de mise en œuvre. De 2009 (année de son introduction) à 2015, douze principaux partenaires ont été identifiés dont l'UNICEF en tête. Les autres acteurs sont notamment Plan Niger, WaterAid, World Vision, REGIS-ER, SNV, Centre Carter, Concern, PHRASEA, CRS, Mercy Corps, RAIL.

L'arrêt de la défécation à l'air libre au Niger passe par l'élaboration d'une feuille de route et d'un plan d'actions qui permettront de :

- Identifier les objectifs à atteindre, les actions à mener et les moyens à mettre en œuvre pour arrêter la défécation à l'air libre au Niger
- Définir les indicateurs d'atteinte des objectifs et des résultats
- Planifier les actions et les moyens sur la période 2016-2020

II. Processus d'élaboration de la Feuille de Route

Le processus a été lancé par le Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement en collaboration avec l'UNICEF et la Coordination nationale du WSSCC. Depuis ce lancement du processus, les actions suivantes ont été menées:

- La tenue de deux ateliers de déclenchement institutionnel sous la présidence du Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, en Juin et Septembre 2016 et d'un déclenchement institutionnel au niveau de trois régions et d'une commune respectivement en février et avril 2017 ;
- La tenue d'une session de formation des formateurs en Septembre 2016 à Maradi suivi du déclenchement de dix (10) villages dans la commune rurale de Kornaka, Département de Dakoro ;
- La tenue d'un atelier multi-acteurs en Septembre 2016 pour la capitalisation des expériences de mise en œuvre de l'ATPC ;

- La mise en place d'un Comité qui sera chargé du suivi de l'élaboration des outils et du processus devant conduire à l'arrêt de la défécation à l'air libre au Niger en Décembre 2016;
- L'élaboration du premier draft de la feuille de route avec l'appui de l'UNICEF et de la SNV, basé sur les ceux du niveau central et des Directions Régionales de l'Hydraulique et de l'Assainissement de Juin 2016 à Mars 2017;
- Le partage, l'amendement et l'appropriation de la feuille de route par la Direction Générale de l'Assainissement (DGA) en Mai 2017.
- La présentation de la feuille de route et des plans d'actions au comité de suivi de l'élaboration des outils et du processus devant conduire à l'arrêt de la défécation à l'air libre au Niger en Juin 2017;
- L'organisation d'un atelier national de validation de la feuille de route et de son plan d'actions, en Juillet 2017.

III. Objectifs de la feuille de route

III.1.Objectif général

L'objectif général de la feuille de route est de mettre fin à la défécation à l'air libre au Niger à l'horizon 2030.

III.2.Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques poursuivis par la feuille de route sont les suivants :

- Arrêter la défécation institutionnelle au Niger;
- Amener les acteurs à construire eux-mêmes les latrines;
- Induire un changement de comportement de la population pour l'utilisation des latrines hygiéniques.
- Faciliter l'accès des populations aux services et équipements d'assainissement durables.

Pour atteindre ces objectifs, sept (7) axes d'interventions ont été identifiés et traduits en plans d'actions pour la période 2016-2020.

IV. Axes de la Feuille de Route

La feuille de route et son plan d'actions sont articulés autour des principaux axes suivants: i) politique et stratégie, ii) Coordination des acteurs, iii) Communication et Plaidoyer, iv) Renforcement des capacités, v) Ingénierie social et infrastructures, vi) Suivi Post FDAL, vii) Mobilisation des Ressources.

IV.1 Politique et stratégie

Pour cet axe, la feuille de route prévoit des actions qui concourent à l'élaboration des documents cadres à tous les niveaux (National, Régional, Départemental et communal):

- Les arrêtés portant création des comités technique et de pilotage relatif à la feuille de route;
- L'élaboration, la validation et l'adoption d'un guide ATPC et d'un guide national d'assainissement de base en vue d'harmoniser les interventions en la matière ;
- La prise en compte de la feuille de route dans le Document de Politique Nationale d'Hygiène et d'Assainissement (DPNHA) ;
- La prise en compte de l'arrêt de la défécation à l'air libre y compris le lavage des mains au savon et la GHM dans les plans locaux de l'Eau et de l'Assainissement (PLEA) des communes ;

IV.2 Coordination des acteurs

La coordination des acteurs de mise en œuvre de la feuille de route s'appuiera sur les actions suivantes:

- La mise en place des dispositifs de suivi évaluation à tous les niveaux ;
- L'harmonisation des interventions en matière d'assainissement ;
- La synergie d'actions entre les acteurs ;
- L'élaboration et la validation d'une feuille de route accompagnée de plans d'actions du niveau central et régionaux 2016-2020 pour l'arrêt de la défécation à l'air libre au Niger;
- Un mécanisme de gestion de données en matière d'assainissement.

IV.3 Communication et plaidoyer

Pour une communication vive et un plaidoyer fort, la feuille de route se basera sur :

- La mobilisation des médias publics, privés et communautaires pour la communication pour un changement de comportement (CCC);
- Le déclenchement institutionnel au niveau des décideurs et leaders d'opinions (les ministres, les députés nationaux, les conseillers régionaux, les élus locaux et les Chefs coutumiers et leaders religieux) ;
- Le plaidoyer en vue de la mise en œuvre effective de la feuille de route
- La vulgarisation des documents cadres ;
- La Capitalisation des expériences ATPC et leur mise à l'échelle à travers les caravanes, les publi-reportages, les sketches, les débats radio télévisés, la production et la diffusion de revue en ATPC.

IV.4 Renforcement des capacités

Le renforcement de capacités de tous les acteurs se fera à travers les actions suivantes:

- La formation en ATPC, en technique de communication, et en marketing de l'assainissement, en déclenchement institutionnel, en suivi-évaluation, etc. ;
- La mise à disposition des ressources humaines, matérielles et logistiques;
- L'organisation et la participation à des rencontres d'échanges d'expériences en matière d'hygiène et d'assainissement principalement l'ATPC ;
- L'appui-conseil à la maîtrise d'ouvrage communale en matière d'hygiène et d'assainissement.

IV.5 Ingénierie sociale et infrastructures

Les actions suivantes sont identifiées dans le cadre de la mise en œuvre de cet axe :

- La mise à l'échelle de l'ATPC dans les villages/quartiers, communes ;
- La réalisation des édicules Publics tenant compte des besoins spécifiques des filles, des femmes et des personnes en situation de handicap ;
- La réalisation des stations de traitement des boues de vidange (STBV).

IV.6 Suivi Post FDAL

Dans le cadre du suivi post FDAL, la feuille de route prévoit les actions suivantes, visant la durabilité des ouvrages et le maintien de l'état de fin de défécation à l'air libre des localités:

- La facilitation de l'accès des populations/ménages aux ouvrages et équipements d'assainissement durables (marketing de l'assainissement, microcrédits, accompagnement, technologies à faible coût...);
- La mise en place d'un mécanisme de veille communautaire pour le maintien du statut de fin de défécation à l'air libre ;
- Appui-conseil aux autorités locales (Chef de canton, élus locaux, leaders...) du maintien du statut FDAL des villages certifiés

IV.7 Mobilisation des ressources

L'exécution de ces six (06) axes stratégiques nécessite une mobilisation conséquente des ressources. À cet effet, la présente feuille de route s'appuie sur les actions suivantes :

- La mise en place d'une stratégie de de plaidoyer et de lobbying auprès de l'Etat et les Partenaires Techniques et Financiers (PTFs) ;
- Affectation d'une part de la ligne budgétaire hygiène et assainissement des communes ainsi que des fonds issus de la vente de l'eau et de la gestion des édicules publics pour le financement des actions pour l'arrêt de la défécation à l'air libre;
- L'identification et la mise en œuvre de mécanismes innovants de financement du sous-secteur de l'assainissement.

V. Acteurs de mise en œuvre de la feuille de route, rôles et responsabilités

V.1 Acteurs de mise en œuvre

Les acteurs de mise en œuvre de la présente feuille de route incluent entre autres:

- L'État, à travers le Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement (MHA), les autres Ministères sectoriels, les services techniques centraux et déconcentrés du MHA et des autres Ministères concernés, les autorités

administratives et coutumières (gouverneurs, préfets, maires, chefs coutumiers) ;

- Les élus nationaux et locaux ;
- Les leaders religieux et d'opinions;
- Les Partenaires Techniques et Financiers ;
- les Organisations Non Gouvernementales ;
- Les médias ;
- Les organisations de la société civile du secteur ;
- La communauté ;
- Le secteur privé.

V.2 Rôles et responsabilités des acteurs

- *Le Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement assure la tutelle du Comité chargé du suivi de l'élaboration des outils et du processus devant conduire à l'arrêt de la défécation à l'air libre au Niger. Le comité a pour mission de:*
 - ✓ *Suivre l'élaboration de la feuille de route nationale et des plans d'actions du niveau central et régionaux ;*
 - ✓ *Adopter la feuille de route nationale et les plans d'actions du niveau central et régionaux ;*
 - ✓ *Veiller à la mise en œuvre de la feuille de route et des plans d'actions ;*
 - ✓ *Coordonner et évaluer la mise en œuvre de la feuille de route et des plans d'actions ;*
 - ✓ *Évaluer et apporter des ajustements nécessaires à une meilleure mise en œuvre de la feuille de route et des plans d'actions ;*
 - ✓ *Veiller à l'alignement des intervenants dans le sous-secteur de l'hygiène et de l'assainissement, à la feuille de route et aux plans d'actions ;*
 - ✓ *Suivre l'élaboration et l'adoption d'un guide de mise en œuvre de l'approche ATPC au Niger*
 - ✓ *Évaluer les ressources requise a la mise en œuvre du plan d'action ;*
 - ✓ *Contribuer à la mobilisation des partenaires en faveur de la mise en œuvre des plans d'actions ;*
- La DGA/MHA assure le rôle de Secrétariat permanent du Comité chargé du suivi de l'élaboration des outils et du processus devant conduire à l'arrêt de la défécation à l'air libre au Niger ;

- Les Élus nationaux et locaux sont chargés du suivi de la mise des engagements liés à l'arrêt de la défécation à l'air libre ;
- Les Gouverneurs, Préfets, Maires assurent la tutelle du processus respectivement au niveau Régional, départemental et communal ;
- Les Directions Régionales, Départementales et les Services Communaux de l'Hydraulique et de l'Assainissement assurent l'appui-conseil et coordonnent la mise en œuvre de la feuille de route et des plans d'actions, en collaboration avec les autres Directions/Services techniques concernés ;
- Les Partenaires Techniques et Financiers accompagnent et/ou contribuent à la mise en œuvre de la feuille de route ;
- Les Organisations Non Gouvernementales/organisations de la société civile: contribuent à l'opérationnalisation de la feuille de route tout en favorisant la mise à l'échelle et en assurant
- Les médias assurent la communication et la visibilité des différentes actions menées;
- Les Chefs Coutumiers relayent la mise en œuvre de la feuille de route ;
- Les Leaders Religieux et d'Opinions accompagnent et facilitent la mise en œuvre de la feuille de route ;
- La Communauté concrétise l'arrêt de la défécation à l'air libre par son engagement effectif et dans toutes les localités du Niger ;
- Le secteur privé favorise l'acquisition des matériaux et équipements d'assainissement et contribue au financement.

VI. Plan d'actions national pour un Niger sans défécation à l'air libre

Pour la mise en œuvre des axes de la feuille de route, un plan d'actions national (niveaux central et régionaux) présenté ci-dessous de manière synthétisé, dont le coût est évalué à 38,285 Milliards, est élaboré pour la période 2016-2020.

Ce plan détaillé en annexe indique, par axe stratégique, les actions, les activités, les stratégies de mise en œuvre des actions, les indicateurs, les budgets et les structures responsables.

VI.1 Synthèse du plan d'actions du niveau central

Axes stratégiques feuille de route	Actions	Budget (cfa)	%
POLITIQUE ET STRATEGIE	Mise en place de deux comités 1 pilotage et 1 technique relatifs à la feuille de route	PM	
	Institutionnalisation d'un guide national ATPC.	20 000 000	1,91%
	Institutionnalisation d'un guide national d'assainissement de base.	5 000 000	0,48%
	Prise en compte de l'arrêt de la défécation à l'air libre y compris le lavage des mains au savon et de la gestion d'hygiène menstruelle (GHM) dans les plans locaux de l'Eau et de l'Assainissement (PLEA) des communes.	PM	
	Prise en compte de la feuille de route dans le Document de Politique Nationale d'Hygiène et d'Assainissement (DPNHA).	PM	
	Sous Total Politique et Strategies	25 000 000	2,39%
COORDINATION DES ACTEURS	Mise en place des dispositifs de suivi évaluation à tous les niveaux	PM	
	Harmonisation des interventions en matière d'assainissement.	165 000 000	15,74%
	Elaboration et validation d'une feuille de route accompagnée de ses plans d'actions du niveau central et régionaux 2016-2020 pour l'arrêt de la défécation à l'air libre au Niger.	15 000 000	1,43%
	Mise en place d'un mécanisme de gestion de données en matière d'assainissement	45 000 000	4,29%
	Sous-total coordination des acteurs	225 000 000	21,47%
COMMUNICATION ET PLAIDOYER	Mobilisation des médias publics, privés et communautaires	100 000 000	9,54%
	Déclenchement institutionnel au niveau des décideurs et leaders d'opinions (les ministres, les députés nationaux, les conseillers régionaux, les élus locaux et les Chefs coutumiers et leaders religieux).	100 000 000	9,54%
	Plaidoyer en vue de la mise en œuvre effective de la feuille de route	PM	
	Capitalisation des expériences ATPC et leur mise à l'échelle à travers les caravanes, les publi-reportages, les sketches, les débats radio télévisés, la production et la diffusion de revue en ATPC.	43 000 000	4,10%
	Sous total Communication et plaidoyer	243 000 000	23,19%
RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS	Formation des acteurs en ATPC, en technique de communication, et en marketing de l'assainissement, en déclenchement institutionnel, en suivi-évaluation..etc	75 000 000	7,16%
	Mise à disposition des ressources humaines, matérielles et logistiques	200 000 000	19,08%
	Organisation et participation à des rencontres d'échanges d'expériences en matière d'hygiène et d'assainissement principalement en ATPC.	30 000 000	2,86%
	ppui-conseil à la maîtrise d'ouvrage communale en matière d'hygiène et d'assainissement notamment en ATPC.	15 000 000	1,43%
	Sous Total Renforcement des Capacités des acteurs	320 000 000	30,53%
INGENIERIE SOCIALE ET INFRASTRUCTURES	Appui à la mise en œuvre de l'ATPC dans les villages/quartiers/communes.	PM	
	Appui à la réalisation des Edicules Publics tenant compte des besoins du genre, des filles, des femmes, des personnes en situation de handicap.	PM	
	Appui à la réalisation des stations de traitement des boues de vidange (STBV).	PM	
	Sous Total Ingénierie sociale et infrastructures		
SUIVI POST FDAL	Appui à la facilitation de l'accès des populations aux ouvrages et équipements d'assainissement durables.	55 000 000	5,25%
	Appui à la mise en place d'un mécanisme de veille communautaire pour le maintien du statut de l'état de fin de défécation à l'air libre	30 000 000	2,86%
	Appui-conseil aux autorités locales (Chef de canton, élus locaux, leaders...) du maintien du statut FDAL des villages certifiés	70 000 000	6,68%
		Sous-total suivi post FDAL	155 000 000
MOBILISATION DES RESSOURCES	Mise en place d'une stratégie de plaidoyer et de lobbying auprès de l'Etat et des Partenaires Techniques et Financiers;	15 000 000	1,43%
	Identification et mise en œuvre de mécanismes innovants de financement du sous-secteur de l'assainissement	45 000 000	4,29%
	Affectation de 50% de la ligne budgétaire hygiène assainissement des communes pour le financement des actions pour l'arrêt de la défécation à l'air libre.	20 000 000	1,91%
	Affectation de 10% du fonds SMEA	PM	
	Affectation de 25 % de fonds de gestion des édifices publics	PM	
	Sous Total Mobilisation des ressources	80 000 000	7,63%
Total plan d'actions niveau central		1 048 000 000	100%

VI.2 Synthèse du plan d'actions des régions

Axes stratégiques feuille de route	Actions	Budget (cfa)	%
POLITIQUE ET STRATEGIE	Mise en place d'un Comité régional chargé du suivi de la mise en œuvre des outils et du processus devant conduire à l'arrêt de la défécation à l'air libre au Niger (Comité FDAL).	PM	
	Contribution à l'élaboration, la validation et la mise en œuvre du guide ATPC	PM	
	Contribution à l'élaboration et à la validation d'un guide national d'assainissement de base.	PM	
	Contribution à l'élaboration, à la validation et à la mise en œuvre d'un guide national d'assainissement de base.	PM	
	Prise en compte de l'arrêt de la défécation à l'air libre y compris le lavage des mains au savon et de la GHM dans les plans locaux de l'Eau et de l'Assainissement (PLEA) des communes.	PM	
Sous Total Politique et Strategies			
COORDINATION DES ACTEURS	Mise en place des dispositifs de suivi évaluation au niveau régional	140 000 000	0,38%
	Harmonisation des interventions en matière d'assainissement.	PM	
	Elaboration et validation d'un plan d'action régional 2016-2020 pour l'arrêt de la défécation à l'air libre.	PM	
	Mise en place d'un mécanisme de gestion de données en matière d'assainissement	130 000 000	0,35%
Sous-total coordination des acteurs		270 000 000	0,73%
COMMUNICATION ET PLAIDOYER	Mobilisation des médias communautaires	PM	
	Déclenchement institutionnel au niveau des décideurs et leaders d'opinions, les autorités administratives régionales, départementales et communales, les conseillers régionaux, les élus locaux et les Chefs coutumiers et leaders religieux.	50 000 000	0,13%
	Plaidoyer en vue de la mise en œuvre effective de la feuille de route		
	Capitalisation des expériences ATPC et leur mise à l'échelle à travers les caravanes, les publi-reportages, les sketches, les débats radio télévisés, la production et la diffusion de revue en ATPC.	250 000 000	
Sous total Communication et plaidoyer		300 000 000	0,80%
RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS	Formation des acteurs en ATPC, en technique de communication, en marketing de l'assainissement, en déclenchement institutionnel, en suivi-évaluation..etc	160 000 000	0,43%
	Gestion optimale des ressources humaines, matérielles et logistiques mises à disposition	500 000 000	1,34%
	Organisation et participation à des rencontres d'échanges d'expériences en matière d'hygiène et d'assainissement.	50 000 000	0,13%
	Appui-conseil à la maîtrise d'ouvrage communale en matière d'hygiène et d'assainissement.	50 000 000	0,13%
Sous Total Renforcement des Capacités des acteurs		760 000 000	2,04%
INGENIERIE SOCIALE ET INFRASTRUCTURES	Mise en œuvre de l'ATPC dans les villages/quartiers/communes	8 160 000 000	21,91%
	Réalisation des Edicules Publics tenant compte des besoins du genre, des filles, des femmes, des personnes en situation de handicap.	19 642 000 000	52,75%
	Réalisation des stations de traitement des boues de vidange (STBV).	7 500 000 000	20,14%
Sous Total Ingénierie sociale et infrastructures		35 302 000 000	94,80%
SUIVI POST FDAL	Facilitation de l'accès des populations aux ouvrages et équipements d'assainissement durables.	300 000 000	0,81%
	Appui à la mise en place d'un mécanisme de veille communautaire pour le maintien du statut de l'état de fin de défécation à l'air libre	200 000 000	0,54%
	Appui-conseil aux autorités locales (Chef de canton, élus locaux, leaders...) du maintien du statut FDAL des villages certifiés	40 000 000	0,11%
	Sous-total suivi post FDAL		540 000 000
MOBILISATION DES RESSOURCES	Identification et mise en œuvre de mécanismes innovants de financement du sous-secteur de l'assainissement	45 000 000	0,12%
	Affectation de 50% de la ligne budgétaire hygiène assainissement des communes pour le financement des actions pour l'arrêt de la défécation à l'air libre.	20 000 000	0,05%
	Affectation de 10% du fonds SMEA	PM	
	Affectation de 25 % de fonds de gestion des édicules publics	PM	
Sous Total Mobilisation des ressources		65 000 000	0,17%
Total plan d'actions niveaux régionaux		37 237 000 000	100%

VI.3 Synthèse Plan d'actions national (synthèse des plans d'actions du niveau central et des régions) par axe de la feuille de route

Axes stratégiques feuille de route	Budget niveau central (cfa)	Budget niveau régional (cfa)	Total (cfa)	%
Politique et Stratégies	25 000 000		25 000 000	0,07%
Coordination des acteurs	225 000 000	270 000 000	495 000 000	1,29%
Communication et plaidoyer	243 000 000	300 000 000	543 000 000	1,42%
Renforcement des Capacités des acteurs	320 000 000	760 000 000	1 080 000 000	2,82%
Opérationnalisation de l'arrêt de la défécation à l'air libre		35 302 000 000	35 302 000 000	92,21%
Suivi post FDAL	155 000 000	540 000 000	695 000 000	1,82%
Mobilisation financière	80 000 000	65 000 000	145 000 000	0,38%
Budget total	1 048 000 000	37 237 000 000	38 285 000 000	100,00%

ANNEXES

Annexe 1. Plan d'actions détaillé du Niveau Central par axe stratégique

FEUILLE DE ROUTE ET PLAN D'ACTION DU NIVEAU CENTRAL (DGA) POUR L'ARRÊT DE LA DEFÉCATION À L'AIR LIBRE AU NIGER

Axes stratégiques feuille de route	Actions	Activités	Stratégie de mise en œuvre	Indicateurs	Situation de référence	Cible en 2020	Acteurs responsables	Période de mise en œuvre	Budget (cfa)	Source de financement	
POLITIQUE ET STRATEGIE	Mise en place de deux comités 1 pilotage et 1 technique relatifs à la feuille de route	Elaboration des projet de texte de création des Comités	Partage du projet de texte avec les partenaires concernés	2 Projets amendés	0		Direction Générale de l'Assainissement (DGA)	déc-16	PM		
		Adoption des projets de texte de création des comités	Suivi du processus d'adoption	2 Arrêtés adoptés	0		Direction Générale de l'Assainissement (DGA)				
	Institutionnalisation d'un guide national ATPC.	Elaboration du Guide ATPC	Recrutement d'un consultant	Guide national ATPC élaboré				Direction Générale de l'Assainissement (DGA)	oct-17	20 000 000	UNICEF
		Validation du Guide ATPC	Implication de toutes les parties prenantes	Document du Guide national ATPC validé				Direction Générale de l'Assainissement (DGA)	nov-17		
		Adoption du Guide ATPC	Suivi du processus d'adoption	Guide national Adopté				Direction Générale de l'Assainissement (DGA)	déc-17		
	Institutionnalisation d'un guide national d'assainissement de base.	Elaboration du guide national d'assainissement de base intégrant un plan de gestion des édicules publics							Fevrier 2018		
		Validation du guide national d'assainissement de base							Fevrier 2018		
		Adoption du Guide national assainissement de base	Elaboration du guide national assainissement de base avec la participation de toutes les parties prenantes à travers les services des consultants	Document du Guide National Assainissement de Base adopté				MHA/Comité interministériel	Fevrier 2018	5 000 000	PNUD
	Prise en compte de l'arrêt de la défécation à l'air libre y compris le lavage des mains au savon et de la gestion d'hygiène menstruelle (GHM) dans les plans locaux de l'Eau et de l'Assainissement (PLEA) des communes.	Révision du guide d'élaboration standardisés des PLEA (TDRs)	Proposition des TDRs prenant en compte l'arrêt de la défécation à l'air libre y compris le lavage des mains au savon et de la GHM	Guide d'élaboration des PLEA révisé				DGA	Fevrier 2019	PM	
	Prise en compte de la feuille de route dans le Document de Politique Nationale d'Hygiène et d'Assainissement (DPNHA).	Prise en compte de la feuille de route dans le DPNHA	Prevoir dans la documentation de DPNHA la copie de la feuille de route	DPNHA prenant en compte l'arrêt de la défécation à l'air libre				DGA	Août 2017	PM	
Sous Total Politique et Strategies									25 000 000		

FEUILLE DE ROUTE ET PLAN D'ACTION DU NIVEAU CENTRAL (DGA) POUR L'ARRÊT DE LA DEFÉCATION A L'AIR LIBRE AU NIGER

Axes stratégiques feuille de route	Actions	Activités	Stratégie de mise en œuvre	Indicateurs	Situation de référence	Cible en 2020	Acteurs responsables	Période de mise en œuvre	Budget (cfa)	Source de financement
COORDINATION DES ACTEURS	Mise en place des dispositifs de suivi évaluation à tous les niveaux	Opérationnalisation du comité technique relatif à l'arrêt de la défécation à l'air libre	Tenue des réunions semestrielles (synthèse des données du niveau régional)	Nombre de notes synthèses			Comité technique	Semestriel	PM	
	Harmonisation des interventions en matière d'assainissement.	Etablissement de la Cartographie des acteurs de mise en œuvre de l'ATPC	synthèse des cartographies régionales	Carte des acteurs réalisée et mise à jour			DGA/MHA	Novembre 2017	PM	
		Organisation de réunions statutaires et extraordinaires du Comité technique FDAL	Implication et responsabilisation des différents membres selon leur domaine d'intervention du comité technique	Nombre de réunions tenues et de missions de suivi effectuées			Comité technique FDAL	En continu	15 000 000	A rechercher
		Vulgarisation des documents de référence DPNHA, SOPHAB et PROSEHA, Guide ATPC, Guide National d'Assainissement, textes législatifs et réglementaires ...	Organisation des Ateliers de vulgarisation, réunions, rencontres et réalisation de publi-reportages	Nombre de personnes touchées			Comité technique FDAL	En continu	150 000 000	A rechercher
		Préparation/validation des dossiers de Projets/Convention qui cadrent avec les documents de référence (PNHA, SOPHAB et PROSEHA, Guide ATPC ...)	Préparation/adoption des dossiers de projets/conventions alignés aux documents de référence (PNHA, SOPHAB et PROSEHA, Guide ATPC ...)	nombre de de projets/convention qui cadrent avec les documents de référence			Comité technique FDAL	En continu	PM	
	Elaboration et validation d'une feuille de route accompagnée de ses plans d'actions du niveau central et régionaux 2016-2020 pour l'arrêt de la défécation à l'air libre au Niger.	Elaboration/Consolidation de la feuille de route et des plans d'actions du niveau central et régionaux	Elaboration des projets des plans d'actions suivant un processus participatif	Plan d'actions national unique et cohérent élaboré,			DGA/MHA	juin-17	PM	
		Validation de la feuille de route et du plan d'action national (plans d'actions du niveau central et régionaux)	Ateliers de validation de la feuille de route et du plan d'action national, suivant un processus participatif	Feuille de route et Plan d'actions national validés			DGA/MHA	juil-17	15 000 000	UNICEF
	Mise en place d'un mécanisme de gestion de données en matière d'assainissement	Etablissement d'une situation de référence de la mise en œuvre de l'ATPC (localités déclenchées et certifiées FDAL)	Organisation des ateliers régionaux de bilan des localités déclenchées et certifiées FDAL et ayant maintenu le statut FDAL	Nombre d'ateliers tenus			DGA/MHA	Périodique	20 000 000	A rechercher
		Etablissement d'une situation de référence des édicules publics	Organisation des ateliers régionaux de bilan des édicules publics	Nombre d'ateliers tenus			DGA/MHA	Périodique	15 000 000	A rechercher
		Mise en place et actualisation régulière d'une base de données nationale sur l'ATPC, les édicules publics et autres services d'hygiène et assainissement	Mise à jour des données sur l'assainissement, renseigner le guide de suivi évaluation du PROSEHA	Une base de données actualisée			DGA/MHA	Annuelle	10 000 000	A rechercher
Sous-total coordination des acteurs									225 000 000	

FEUILLE DE ROUTE ET PLAN D'ACTION DU NIVEAU CENTRAL (DGA) POUR L'ARRET DE LA DEFECCATION A L'AIR LIBRE AU NIGER

Axes stratégiques feuille de route	Actions	Activités	Stratégie de mise en œuvre	Indicateurs	Situation de référence	Cible en 2020	Acteurs responsables	Période de mise en œuvre	Budget (cfa)	Source de financement
COMMUNICATION ET PLAIDOYER	Mobilisation des médias publics, privés et communautaires	Implication des médias dans les activités de l'assainissement	Sensibilisation à travers les rencontres, les ateliers, réunions et conférences, voyage d'études...	Nombre de médias mobilisés			MHA	Continue	100 000 000	
	Déclenchement institutionnel au niveau des décideurs et leaders d'opinions (les ministres, les députés nationaux, les conseillers régionaux, les élus locaux et les Chefs coutumiers et leaders religieux).	Organisation des séances de déclenchement institutionnel auprès des décideurs et leaders d'opinions	Séminaires gouvernemental et parlementaire, AG AMN et ARENI, réunions des autres Institutions de la république	Nbre de lettres d'engagements signées			Comité technique FDAL	Continue	100 000 000	WSSCC, UNICEF, Complément à rechercher
	Plaidoyer en vue de la mise en œuvre effective de la feuille de route	Organisation des séances de plaidoyer auprès des partenaires	Tenue des réunions	Nombre de séances de plaidoyer tenues			DGA	Continue	PM	
		Communication de masse ciblée sur l'ATPC lors des grands événements (lutte traditionnelle, 18 décembre.....)	Séance de sensibilisation à travers les médias	Nombre de séances de sensibilisation			DGA	Continue	PM	
		Introduction d'une journée ATPC lors de semaine de l'eau....	Tenue de la journée	Nombre de journées organisées			DGA	Continue	PM	
	La Capitalisation des expériences ATPC et leur mise à l'échelle à travers les caravanes, les publi-reportages, les sketches, les débats radio télévisés, la production et la diffusion de revue en ATPC.	Organisation de Caravanes et de sketches de sensibilisation sur l'ATPC	Organisation et tenue des caravanes	Nombre de caravanes par an; Nombre de sketches par an			DGA/MHA, Comité FDAL	A partir de Novembre 2017	20 000 000	A rechercher
		Documentation et vulgarisation des faits marquants et de facteurs de diffusion des expériences de l'ATPC	Production et diffusion des expériences ATPC	Nombre des documentaires radio-télévisés produits			DGA/MHA, Comité FDAL	févr-18	15 000 000	A rechercher
		Réalisation de publi-reportages des localités/communes FDAL	Diffusion radio télévisé et presse écrite	Nombre de publi-reportages réalisés			DGA/MHA, Comité FDAL	Apartir de Novembre 2017 de façon séquentielle	5 000 000	A rechercher
		Production de revue sur l'ATPC	Production et diffusion de la revue	Nombre revues publiées			DGA/MHA, Comité FDAL	A partir de Novembre 2017	3 000 000	A rechercher
	Sous total Communication et plaidoyer									243 000 000

FEUILLE DE ROUTE ET PLAN D'ACTION DU NIVEAU CENTRAL (DGA) POUR L'ARRÊT DE LA DEFECATION A L'AIR LIBRE AU NIGER

Axes stratégiques feuille de route	Actions	Activités	Stratégie de mise en œuvre	Indicateurs	Situation de référence	Cible en 2020	Acteurs responsables	Période de mise en œuvre	Budget (cfa)	Source de financement	
REINFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS	Formation des acteurs en ATPC, en technique de communication, et en marketing de l'assainissement, en déclenchement institutionnel, en suivi-évaluation..etc	Identification des formateurs en ATPC	Revue documentaires et enquêtes auprès des partenaires	Nombre de formateurs identifiés			DGA/MHA	Juin 2017	5 000 000	A rechercher	
		Formalisation d'un pool de formateurs	Acte de formalisation	Un pool de formateurs formalisé			DGA				
		Elaboration des modules de formation en ATPC, en technique de communication, et en marketing de l'assainissement, en déclenchement institutionnel, en suivi-évaluationetc; par le pool de formateurs	Revue documentaire à la suite d'une retraite	Nombre de modules conçus par thématique			DGA/MHA, Comité FDAL	Août 2017	PM		
		Validation des modules de formation	Organisation de réunions de validation	Nombre de modules validés par thématique			Comité technique		PM		
		Formation des organisations des médias à travers des sessions thématiques sur l'assainissement	Organisation et tenue des sessions de formation	Nombre de médias formés						50 000 000	
		Appui aux sessions de formation en ATPC, en technique de communication, et en marketing de l'assainissement, en déclenchement institutionnel, en suivi-évaluationetc au profit de tous les acteurs	Organisation et tenue des sessions de formation	Nombre d'acteurs formés			DGA	En continue		20 000 000	A rechercher
	Mise à disposition des ressources humaines, matérielles et logistiques	Affectation de ressources humaines requises	Expression et suivi des besoins en personnel	Nombre de personnel mis à disposition			DRH	Continue	PM		A rechercher
		Dotation en matériel de travail	Suivi des expressions des besoins	Nombre de matériel acquis			DRFM	Continue	50 000 000		A rechercher
		Affectation de la logistique requise	Suivi des expressions des besoins	Nombre de logistique acquis			DRFM	Continue	150 000 000		A rechercher
	Organisation et participation à des rencontres d'échanges d'expériences en matière d'hygiène et d'assainissement principalement en ATPC.	Rencontres, voyage d'études et d'échanges d'expériences en ATPC	Organisations et tenues des voyages d'études	Nombre de voyages d'études organisés			DGA	2018	20 000 000		A rechercher
		Appui à l'Organisation des rencontres d'échanges entre les acteurs au niveau communautaire	Orientations des rencontres	Nombre de rencontres organisées			DGA	2018	10 000 000		A rechercher
	Appui-conseil à la maîtrise d'ouvrage communale en matière d'hygiène et d'assainissement notamment en ATPC.	Appui au rRenforcement des capacités des élus locaux, des services techniques communaux en matière d'assainissement notamment en ATPC	Organisation des sessions d'appui-conseil	Nombre de missions d'appui conseil			DGA	Continu	15 000 000		A rechercher
	Sous Total Renforcement des Capacités des acteurs									320 000 000	

FEUILLE DE ROUTE ET PLAN D'ACTION DU NIVEAU CENTRAL (DGA) POUR L'ARRET DE LA DEFECCATION A L' AIR LIBRE AU NIGER

Axes stratégiques feuille de route	Actions	Activités	Stratégie de mise en œuvre	Indicateurs	Situation de référence	Cible en 2020	Acteurs responsables	Période de mise en œuvre	Budget (cfa)	Source de financement
INGENIERIE SOCIALE ET INFRASTRUCTURES	Appui à la mise en œuvre de l'ATPC dans les villages/quartiers/communes	appui Declenchement de 10 000 villages et de 200 quartiers/communes	Appui à la Mise en œuvre du guide ATPC	Nombre de villages/quartiers déclenchés			DGA	2016-2020	PM	UNICEF.... reste à rechercher
		appui à la certification de 10481 villages et 200 quartiers	Mise en œuvre des outils ATPC	Nombre de villages/quartiers certifiés			DGA	2016-2020	PM	
	Appui à la réalisation des Edicules Publics tenant compte des besoins du genre, des filles,des femmes, des personnes en situation de handicap.	Appui à la Dotation de 4000 établissements scolaires en système adéquats d'assainissement	Appui à l'iIdentification des établissements existants prioritaires; accompagnement de la construction de chaque nouvelle salle de classe d'édicules scolaires	Nombre d'établissements scolaires équipés			DGA/MHA, Comité FDAL, DRHA, comités Régionaux FDAL	2016-2020	PM	BM, AFD, PHRASEHA, UNICEF... reste à rechercher
		Appui à la Dotation de 814 formations sanitaires en systèmes adéquats d'assainissement	appui à Identification des formations sanitaires existantes prioritaires; accompagnement de la construction de chaque formation sanitaire d'édicules publics	Nombre de formations sanitaires équipés			DGA/MHA, Comité FDAL, DRHA, comités Régionaux FDAL	2016-2020	PM	BM, AFD, PHRASEHA, UNICEF... reste à rechercher
		Appui à la Dotation de 4 000 autres lieux publics de systèmes adéquats d'assainissement	Appui à l'iIdentification des lieux publics prioritaires	Nombre de lieux publics équipés			DGA/MHA, Comité FDAL, DRHA, comités Régionaux FDAL	2016-2020	PM	BM, AFD, PHRASEHA, UNICEF... reste à rechercher
	Appui à la réalisation des stations de traitement des boues de vidange (STBV).	Appui à la Construction de trois (3) stations de traitement des boues de vidange à Niamey	Appui à la prevision dans le plan Identification d'aménagement urbain et implantation de sites d'implantation de (STBV)	Nombre de STBV construits			DGA/MHA, Comité FDAL, DRHA, comités Régionaux FDAL	2016-2020	PM	BM,reste à rechercher
	Sous Total Sous Total Ingénierie sociale et infrastructures									PM

FEUILLE DE ROUTE ET PLAN D'ACTION DU NIVEAU CENTRAL (DGA) POUR L'ARRET DE LA DEFECATION A L'AIR LIBRE AU NIGER

Axes stratégiques feuille de route	Actions	Activités	Stratégie de mise en œuvre	Indicateurs	Situation de référence	Cible en 2020	Acteurs responsables	Période de mise en œuvre	Budget (cfa)	Source de financement
SUIVI POST FDAL	Appui à la facilitation de l'accès des populations aux ouvrages et équipements d'assainissement durables.	Appui à la Formation des maçons pour la promotion de la réalisation/production des ouvrages et équipements d'hygiène et d'assainissement ;	Appui à l'identification, formation/recyclage et constitution réseaux des maçons à recycler/former, Identification des formateurs, Appui à l'élaboration des modules de formation et session de formation	Nombre de maçons recyclés / formés			DGA/MHA, comité FDAL	En continu à partir de Juin 2017	15 000 000	A rechercher
		Appui à la Promotion de points de vente des équipements d'hygiène et d'assainissement afin d'impulser une dynamique d'entreprenariat privé dans les villages/quartiers	Appui à la Mobilisation du secteur privé/Projets ONG pour la mise en place des points de vente des équipements	Nombre de points de vente mis en place et fonctionnels			DGA/ MHA, Comité FDAL	Janvier 2018	5 000 000	A rechercher
		Appui à la Promotion de tontines/microcrédits spécifiques à la réalisation de latrines familiales et à l'acquisition d'équipements d'hygiène et d'assainissement	Appui à la Mobilisation des projets, ONGs, institutions de microfinances, GIE,Associations villageoises	Nombre d'institutions de de tontines/microcrédits fonctionnelles			DGA/ MHA, Comité FDAL	janv-18	5 000 000	A rechercher
		Recherche-action sur les technologies d'hygiène et d'assainissement à faible coût y compris la gestion de boues de vidange	Réalisation et valorisation des études	Nombre d'études réalisées			DGA/MHA, comité FADL	En continu à de Mai 2017	30 000 000	A rechercher
	Appui à la mise en place d'un mécanisme de veille communautaire pour le maintien du statut de fin de défécation à l'air libre	Appui à la Promotion au sein des communautés des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement Hygiène de la chaîne de l'eau de boisson, Échanges et concours inter villages/quartiers, renforcement des connaissances des populations; journées de salubrité....)	Appui à l'Intensification de la communication en matière d'hygiène et d'assainissement	Nombre de villages adoptant les bonnes pratiques			DGA/MHA, comité FADL	En continu à partir de Juillet 2017	10 000 000	A rechercher
		Appui à la Promotion de la solidarité en matière d'hygiène et d'assainissement, au sein de la communauté (travaux d'intérêt collectif, entre aide)	Appui à l'Intensification de la communication en matière d'hygiène et d'assainissement	Nombre de villages touchés			DGA/MHA, comité FADL	En continu à partir de Juillet 2017	10 000 000	A rechercher
		Appui à la Promotion des initiatives locales d'une réglementation locale et des normes sociales relatives à des pénalités pour les contrevenants au maintien des bonnes pratiques d'hygiène et l'assainissement.	Appui a la Encouragement des initiatives locales et normes sociales définition d'une réglementation locale et des normes sociales	Nombre de villages appliquant les initiatives locales et normes sociales			DGA/MHA, comité FADL	En continu à partir de Juillet 2017	10 000 000	A rechercher
	Appui-conseil aux autorités locales (Chef de canton, élus locaux, leaders...) du maintien du statut FDAL des villages certifiés	Organisation des missions de supervision de suivi-évaluation des villages FDAL	Utilisation des outils de suivi-évaluation	Nombre de missions de suivi réalisés			DGA	Continue	40 000 000	
		Organisation des rencontres d'échanges et de partage d'expériences du maintien du statut FDAL entre les villages certifiés	Tenue de journées de partage	Nombre de rencontres organisées			DGA	Continue	30 000 000	
	Sous-total suivi post FDAL									155 000 000

FEUILLE DE ROUTE ET PLAN D'ACTION DU NIVEAU CENTRAL (DGA) POUR L'ARRÊT DE LA DÉFÉCATION À L'AIR LIBRE AU NIGER

Axes stratégiques feuille de route	Actions	Activités	Stratégie de mise en œuvre	Indicateurs	Situation de référence	Cible en 2020	Acteurs responsables	Période de mise en œuvre	Budget (cfa)	Source de financement	
MOBILISATION DES RESSOURCES	Mise en place d'une stratégie de plaidoyer et de lobbying auprès de l'Etat et des Partenaires Techniques et Financiers;	Plaidoyer et lobbying auprès des partenaires techniques et financiers	Présentation de la feuille de route lors des tables rondes, des réunions de cluster, des cadres de concertation Etat/PTF, Revues, Ateliers, Arbitrage ..etc	Nombre de réunions réalisées			DGA	En 2018	5 000 000	A rechercher	
		Mise en œuvre des engagements sur l'affectation de 0,5% du PIB dans la loi des finances pour le sous-secteur de l'assainissement	Tenue des séances de lobbying auprès du ministère en charge des finances, des parlementaires	Budget mobilisé			DGA	En 2019	10 000 000	A rechercher	
	Identification et mise en œuvre de mécanismes innovants de financement du sous-secteur de l'assainissement	Réalisation d'une étude sur les mécanismes de financement innovants	Prestation intellectuelle suivant un processus participatif	Etude réalisée			DGA	2 018	30 000 000	A rechercher	
		Mise en œuvre des résultats de l'étude sur les mécanismes innovants	Réalisation d'un test pilote	Nombre de mécanismes innovants mis en œuvre			DGA				
		Révision des textes réglementaires et des modalités d'alimentation des fonds national, régional et communal de l'eau et de l'assainissement	Organisation des ateliers ou des journées d'échanges avec les ministères en charge des finances et du plan et les députés Nationaux	Nombre de textes révisés			DGA	Juin 2017	15 000 000	A rechercher	
	Affectation de 50% de la ligne budgétaire hygiène assainissement des communes pour le financement des actions pour l'arrêt de la défécation à l'air libre.	Apui au plaidoyer auprès des communes pour l'exécution conséquente du montant alloué à la DAL	Réunions/ateliers de présentation de la feuille de route	xx montant dépensé			DGA	Juin - Décembre 2017	20 000 000	A rechercher	
	Affectation de 10% du fonds SMEA	Répartition du fonds SMEA dans les missions de suivi des activités de l'eau et de l'assainissement.	Matérialisation par un acte communal	Nombre de communes ayant pris l'acte							
	Affectation de 25 % de fonds de gestion des édicules publics	Elaboration de modèle de contrat de gestion des édicules publics	Elaboration d'un plan de gestion des édicules publics	XX Montant mobilisé			DGA	2 019	PM	A rechercher	
	Sous Total Mobilisation des ressources									80 000 000	
										1 048 000 000	

Annexe 2: Plan d'actions détaillé des Régions par axe stratégique

FEUILLE DE ROUTE ET PLAN D'ACTION DES REGIONS POUR L'ARRÊT DE LA DEFÉCATION A L'AIR LIBRE AU NIGER

Axes stratégiques feuille de route	Actions	Activités	Stratégie de mise en œuvre	Indicateurs	Situation de référence	cible 2020	Acteur responsable	Période de mise en œuvre	Budget (cfa)	Source de financement
POLITIQUE ET STRATEGIE	Mise en place d'un Comité régional chargé du suivi de la mise en œuvre des outils et du processus devant conduire à l'arrêt de la défécation à l'air libre au Niger (Comité FDAL).	Matérialiser le Comité FDAL régional par un texte	Partage du texte avec les partenaires concernés	Arrêté portant création d'un Comité régional chargé du suivi de la mise en œuvre de la feuille de route			Gouverneur	Juin 2017	PM	
	Contribution à l'élaboration, la validation et la mise en œuvre du guide ATPC	Participer aux ateliers/réunions	Participation aux réunions avec toutes les parties prenantes	Nombre d'ateliers/réunions tenus			DRHA	avril-Juin 2017	PM	UNICEF
		Vulgariser le guide ATPC	Organisations des rencontres de partage avec les différents acteurs	Nombre de rencontres tenues			Président du comité FDAL		PM	
	Contribution à l'élaboration, à la validation et à la mise en œuvre d'un guide national d'assainissement de base.	Participer aux ateliers/réunions	Participation aux réunions avec toutes les parties prenantes	Nombre d'ateliers/réunions tenus			DRHA, Comité régional FDAL	juillet-août 2017	PM	PNUD
		Vulgariser le guide national d'assainissement de base	Organisations des rencontres de partage avec les différents acteurs	Nombre de rencontres tenues			Président du comité FDAL		PM	
	Prise en compte de l'arrêt de la défécation à l'air libre y compris le lavage des mains au savon et de la GHM dans les plans locaux de l'Eau et de l'Assainissement (PLEA) des communes.	Veiller à la prise en compte de l'arrêt de défécation à l'air libre y compris la GHM dans les PLEA	Amendement des PLEA	Nombre de PLEA tenant compte du FDAL et GHM			DREP/DRHA	Juin 2017	PM	
Sous Total Politique et Strategies									PM	

FEUILLE DE ROUTE ET PLAN D'ACTION DES REGIONS POUR L'ARRET DE LA DEFECATION A L'AIR LIBRE AU NIGER

Axes stratégiques feuille de route	Actions	Activités	Stratégie de mise en œuvre	Indicateurs	Situation de référence	cible 2020	Acteur responsable	Période de mise en œuvre	Budget (cfa)	Source de financement	
COORDINATION DES ACTEURS	Mise en place des dispositifs de suivi évaluation au niveau régional	Opérationnaliser le comité régional FDAL	Tenue des réunions trimestrielles (synthèse des données du niveau régional)	Nombre de notes synthèses			Gouverneur		PM		
	Harmonisation des interventions en matière d'assainissement.	Etablir la Cartographie régionale des acteurs de mise en œuvre de l'ATPC	synthèse des cartographies départementales	Carte régionale des acteurs réalisée et mise à jour			DA/DRHA	Oct 2017	PM		
		Organiser des réunions ordinaires et extraordinaires du Comité régional FDAL	Implication et responsabilisation des différents membres selon leur domaine d'intervention	Nombre de réunions tenues			Président du comité régional FDAL	En continu à partir de Mai 2017	40 000 000	A rechercher	
		Vulgariser des documents de référence DPNHA, SOPHAB et PROSEHA, textes législatifs et réglementaires ...	Organisation des Ateliers de vulgarisation, réunions, rencontres et réaliser des publi-reportages	Nombre de personnes touchées au niveau de la région			Comité Régional FDAL	En continu	100 000 000	A rechercher	
		Préparer et valider des dossiers de Projets régionaux cadrant avec les documents de référence (PNHA, SOPHAB et PROSEHA, Guide ATPC ...)	Amendement des dossiers de projets alignés aux documents de référence (PNHA, SOPHAB et PROSEHA, Guide ATPC ...)	Nombre de projets cadrant avec les documents de références adoptés			Gouverneur	En continu	PM		
	Elaboration et validation d'un plan d'action régional 2016-2020 pour l'arrêt de la défécation à l'air libre.	Elaborer et consolider les plans d'actions départementaux	Elaboration des projets des plans d'actions suivant un processus participatif	Plan d'actions régional unique et cohérent élaboré, suivant un processus participatif			DRHA	Janvier à Mai 2017	PM		
		Participer à la validation de la feuille de route et des plans d'actions régionaux	Ateliers de validation de la feuille de route et du plan d'actions régional, suivant un processus participatif et recherche de financement	Feuille de route et Plan d'actions régional validés suivant un processus participatif			DRHA	A partir de Juin 2017	PM	UNICEF	
	Mise en place d'un mécanisme de gestion de données en matière d'assainissement	Etablir une situation de référence de la mise en œuvre de l'ATPC (localités déclenchées et certifiées FDAL)	Missions/ateliers de bilan des localités déclenchées et certifiées FDAL	Une situation de référence des villages déclenchés et FDAL fin 2017			DA/DRHA	Décembre 2017	50 000 000	A rechercher	
		Etablir une situation de référence des édicules publics	Missions/ateliers de bilan des édicules publics	Une situation de référence des édicules publics en fin 2017			DA/DRHA	Décembre 2017	40 000 000	A rechercher	
		Mettre en place et actualiser régulièrement la base de données régionale sur l'ATPC, les édicules publics et autres services d'hygiène et assainissement	Mise à jour des données sur l'assainissement, renseigner le guide de suivi évaluation du PROSEHA	Une base de données à jour			DRES/DRHA	Fréquence annuelle à partir de 2017	40 000 000	A rechercher	
	Sous-total coordination des acteurs									270 000 000	

FEUILLE DE ROUTE ET PLAN D'ACTION DES REGIONS POUR L'ARRET DE LA DEFECTION A L'AIR LIBRE AU NIGER

Axes stratégiques feuille de route	Actions	Activités	Stratégie de mise en œuvre	Indicateurs	Situation de référence	cible 2020	Acteur responsable	Période de mise en œuvre	Budget (cfa)	Source de financement
COMMUNICATION ET PLAIDOYER	Mobilisation des médias communautaires	Implication des médias dans les activités de l'assainissement	Sensibilisation à travers les rencontres, les ateliers, réunions et conférences, voyage d'études....	Nombre de médias mobilisés			DRHA	Continue		
	Déclenchement institutionnel au niveau des décideurs et leaders d'opinions, les autorités administratives régionales, départementales et communales, les conseillers régionaux, les élus locaux et les Chefs coutumiers et leaders religieux.	Organiser des déclenchements institutionnels au niveau des décideurs et leaders d'opinions	Sessions/ateliers de DI	Nbre d'engagements signés			Comité régional FDAL	juil-17	50 000 000	A rechercher
	Plaidoyer en vue de la mise en œuvre effective de la feuille de route	Organiser des séances de plaidoyer auprès des partenaires	Tenue des réunions	Nombre de séances de plaidoyer tenues			Gouverneur			
		Faire des communications de masse ciblée sur l'ATPC lors des grands événements (lutte traditionnelle, 18 décembre.....)	Séance de sensibilisation à travers les médias	Nombre de séances de sensibilisation			DRHA			
		Célébrer la journée ATPC lors de la semaine de l'eau....	Célébration de la journée ATPC	Nombre de journées célébrées			DRHA			
	Capitalisation des expériences ATPC et leur mise à l'échelle à travers les caravanes, les publi-reportages, les sketchs, les débats radio télévisés, la production et la diffusion de revue en ATPC.	Organiser des caravanes et de sketchs de sensibilisation sur l'ATPC	Organisation et tenue des caravanes	Nombre de caravanes réalisées Nombre de sketchs produits			Comité régional FDAL	A partir de Novembre 2017	80 000 000	A rechercher
		Documenter et vulgariser des faits marquants et de facteurs de diffusion des expériences de l'ATPC	Production et diffusion des expériences ATPC	Nombre de documentaires radio-télévisés diffusés			Comité régional FDAL	févr-18	100 000 000	A rechercher
		Réaliser de publi-reportages des localités/communes FDAL	Diffusion radio télévisé et presse écrite	Nombre de publi-reportages réalisés			Comité régional FDAL	Apartir de Novembre 2017 de façon séquentielle	50 000 000	A rechercher
		Produire de revue sur l'ATPC	Production et diffusion de la revue	Nombre de revues publiées			Comité régional FDAL	A partir de Novembre 2017	20 000 000	A rechercher
	Sous total Communication et plaidoyer									300 000 000

FEUILLE DE ROUTE ET PLAN D'ACTION DES REGIONS POUR L'ARRET DE LA DEFECCATION A L'AIR LIBRE AU NIGER

Axes stratégiques feuille de route	Actions	Activités	Stratégie de mise en œuvre	Indicateurs	Situation de référence	cible 2020	Acteur responsable	Période de mise en œuvre	Budget (cfa)	Source de financement	
RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS	Formation des acteurs en ATPC, en technique de communication, en marketing de l'assainissement, en déclenchement institutionnel, en suivi-évaluation...etc	Identifier les formateurs en ATPC	Reuves documentaires	Nombre de formateurs identifiés			DRHA, Comité régional FDAL	Mai 2017	10 000 000	A rechercher	
		Formaliser le pool de formateurs	Acte de formalisation	Un pool de formateurs formalisé				PM	PM		
		Contribuer à l'élaboration des modules de formation en ATPC, en technique de communication, et en marketing de l'assainissement, en déclenchement institutionnel, en suivi-évaluationetc; par le pool de formateurs	Séances de travail d'amendement	Nombre de modules amendés par thématique					PM	PM	
		Contribuer à la validation des modules de formation	Participation aux réunions de validation	Nombre de modules validés par thématique					PM	PM	
		Former les organes des médias communautaires à travers des sessions thématiques sur l'assainissement	Organisation et tenue des sessions de formation des organes de médias	Nombre de médias formés				DRHA, Comité régional FDAL	Août 2017	50 000 000	
		Organiser des sessions de formation en ATPC, en technique de communication, et en marketing de l'assainissement, en déclenchement institutionnel, en suivi-évaluationetc au profit de tous les acteurs	Organisation et tenue des sessions de formation des acteurs	Nombre d'acteurs formés				DRHA, Comité régional FDAL	En continue à partir de février 2017	100 000 000	A rechercher
	Gestion optimale des ressources humaines, matérielles et logistiques mises à disposition	Responsabiliser les cadres mis à disposition au niveau des structures concernées	Désignation des points focaux par structures	Nombre de structures avec points focaux actifs			DR	En continue	PM	A rechercher	
		Se procurer le matériel de travail nécessaire	Organisation des rencontres de suivi des besoins exprimés	Nombre de matériels acquis			DRHA	En continue	100 000 000	A rechercher	
		se doter de la logistique requise	Organisation des rencontres de suivi des besoins exprimés	Nombre de logistique acquis			DRHA	En continue	400 000 000	A rechercher	
	Organisation et participation à des rencontres d'échanges d'expériences en matière d'hygiène et d'assainissement.	Organiser des rencontres, voyage d'études et d'échanges d'expériences en ATPC	Organisations et tenues des voyages d'études	Nombre de voyages d'études organisés			Comité régional FDAL	2018	30 000 000	A rechercher	
		Organiser des rencontres d'échanges entre les acteurs au niveau communautaire	Evaluation des rencontres communautaires	Nombre de rencontres tenues			Comité régional FDAL	2018	20 000 000	A rechercher	
	Appui-conseil à la maîtrise d'ouvrage communale en matière d'hygiène et d'assainissement.	Renforcer les capacités des élus locaux, des services techniques communaux en matière d'assainissement notamment en ATPC	Organisation des sessions d'appui-conseil	Nombre de missions d'appui conseil conduites			Comité régional FDAL	En continu à partir de 2018	50 000 000	A rechercher	
	Sous Total Renforcement des Capacités des acteurs									760 000 000	

FEUILLE DE ROUTE ET PLAN D'ACTION DES REGIONS POUR L'ARRET DE LA DEFECCATION A L'AIR LIBRE AU NIGER

Axes stratégiques feuille de route	Actions	Activités	Stratégie de mise en œuvre	Indicateurs	Situation de référence		Acteur responsable	Période de mise en œuvre	Budget (cfa)	Source de financement
						cible 2020				
INGENIERIE SOCIALE ET INFRASTRUCTURES	Mise en œuvre de l'ATPC dans les villages/quartiers.	Déclenchement de.... villages et dequartiers	Mise en œuvre du guide ATPC	Nombre de villages/quartiers déclenchés			DRHA	2016-2020	8 160 000 000	UNICEF....reste à rechercher
		Certification de Villages/quartiers/communes	Mise en œuvre des outils ATPC	Nombre de villages/quartiers certifiés			DRHA		PM	
	Réalisation des Edicules Publics tenant compte des besoins du genre, des filles,des femmes, des personnes en situation de handicap.	Suivre la réaliation de infrastructures scolaires en système adéquats d'assainissement	Identification des établissements existants prioritaires; accompagnement de la construction de chaque nouvelle salle de classe d'édicules scolaires	Nombre d'établissements scolaires équipés			DRHA	2016-2020	14 000 000 000	BM, AFD, PHRASEHA , UNICEF... reste à rechercher
		Suivre la réalisation deinfrastructures dans les formations sanitaires en systèmes adéquats d'assainissement	Identification des formation sanitaires existantes prioritaires; accompagnement de la construction de chaque formation sanitaire d'édicules publics	Nombre de formations sanitaires équipées			DRHA	2016-2020	2 442 000 000	BM, AFD, PHRASEHA , UNICEF... reste à rechercher
		Suivre la réalisation de infrastructures des autres lieux publics de systèmes adéquats d'assainissement	Identification des lieux publics prioritaires prioritaires;	Nombre de lieux publics équipés			DRHA	2016-2020	3 200 000 000	BM, AFD, PHRASEHA , UNICEF... reste à rechercher
	Réalisation des stations de traitement des boues de vidange (STBV).	Construire une station de traitement de boues de vidange	Identification et implantation du site (STBV)	Une STBV construite				2016-2020	7 500 000 000	BM,reste à rechercher
	Sous Total ingénierie sociale et infrastructures									35 302 000 000

FEUILLE DE ROUTE ET PLAN D'ACTION DES REGIONS POUR L'ARRET DE LA DEFECCATION A L'AIR LIBRE AU NIGER

Axes stratégiques feuille de route	Actions	Activités	Stratégie de mise en œuvre	Indicateurs	Situation de cible 2020	Acteur responsable	Période de mise en œuvre	Budget (cfa)	Source de financement
SUIVI POST FDAL	Facilitation de l'accès des populations aux ouvrages et équipements d'assainissement durables.	Former des maçons pour la promotion de la réalisation/production des ouvrages et équipements d'hygiène et d'assainissement	Identification, formation/recyclage et réseautage des maçons	Nombre de maçons recyclés / formés		Comité régional FDAL	En continu à partir de Juin 2017	100 000 000	A rechercher
		Promouvoir des points de vente des équipements d'hygiène et d'assainissement afin d'impulser une dynamique d'entreprenariat privé dans les villages/quartiers	Mobilisation du secteur privé/Projets ONG pour la mise en place des points de vente des équipements	Nombre de points de vente mis en place et fonctionnels		Comité régional FDAL	Février 2018	100 000 000	A rechercher
		Promouvoir des tontines/microcrédits spécifiques à la réalisation de latrines familiales et à l'acquisition d'équipements d'hygiène et d'assainissement	Mobilisation des projets, ONGs, institutions de microfinances, GIE, Associations villageoises	Nombre d'institutions de tontines/microcrédits fonctionnelles		Comité régional FDAL	févr-18	50 000 000	A rechercher
		Contribuer à la réalisation d'une recherche-action sur les technologies d'hygiène et d'assainissement à faible coût y compris la gestion de boues de vidange	Réalisation et valorisation des études	Nombre d'études réalisées		Comité régional FDAL	En continu à de Septembre 2018	50 000 000	A rechercher
	Appui à la mise en place d'un mécanisme de veille communautaire pour le maintien du statut de l'état de fin de défécation à l'air libre	Promouvoir au sein des communautés des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement(Hygiène de la chaîne de l'eau de boisson, Échanges et concours inter villages/quartiers, Le renforcement des connaissances des populations; journées de salubrité...)	Intensification de la communication en matière d'hygiène et d'assainissement	Nombre de villages adoptant les bonnes pratiques		DRHA	En continu	100 000 000	A rechercher
		Promouvoir la solidarité en matière d'hygiène et d'assainissement, au sein de la communauté (travaux d'intérêt collectif, entre aide)	Intensification de la communication en matière d'hygiène et d'assainissement	Nombre de villages touchés		DRHA	En continu	50 000 000	PM
		Faire la promotion des initiatives locales et des normes sociales relatives à des pénalités pour les contrevenants au maintien des bonnes pratiques d'hygiène et l'assainissement.	Encouragement des initiatives locales et normes sociales	Nombre de villages appliquant les initiatives locales et normes sociales		DRHA	En continu	50 000 000	A rechercher
	Appui-conseil aux autorités locales (Chef de canton, élus locaux, leaders...) du maintien du statut FDAL des villages certifiés	Organiser des missions de supervision de suivi-évaluation des villages FDAL	Utilisation des outils de suivi-évaluation	Nombre de missions de suivi réalisés				20 000 000	
		Organiser des rencontres d'échanges et de partage d'expériences du maintien du statut FDAL entre les villages certifiés	Tenue de journées de partage	Nombre de rencontres organisées				20 000 000	
	Sous-total suivi post FDAL								540 000 000

FEUILLE DE ROUTE ET PLAN D'ACTION DES REGIONS POUR L'ARRÊT DE LA DEFECATION A L'AIR LIBRE AU NIGER

Axes stratégiques feuille de route	Actions	Activités	Stratégie de mise en œuvre	Indicateurs	Situation de référence	cible 2020	Acteur responsable	Période de mise en œuvre	Budget (cfa)	Source de financement
Mobilisation des ressources	Identification et mise en œuvre de mécanismes innovants de financement du sous-secteur de l'assainissement	Contribuer à la réalisation d'une étude sur les mécanismes de financement innovants	Prestation intellectuelle suivant un processus participatif	Etude réalisée			DRHA	2 018	30 000 000	A rechercher
		Mettre en œuvre les résultats de l'étude sur les mécanismes innovants	Réalisation d'un test pilote	Nombre de mécanismes innovants mis en œuvre			DRHA			
		Contribuer à la révision des textes réglementaires et des modalités d'alimentation des fonds national, régional et communal de l'eau et de l'assainissement	Participation à des ateliers ou des journées d'échanges	Nombre de textes révisés			DRHA	Juin 2017	15 000 000	A rechercher
	Affectation de 50% de la ligne budgétaire hygiène assainissement des communes pour le financement des actions pour l'arrêt de la défécation à l'air libre.	Booster auprès des communes pour l'exécution conséquente du montant alloué à la DAL	Réunions de présentations des documents cadres	xx montant dépensé			DRHA	Juin - Decembre 2017	20 000 000	A rechercher
	Affectation de 10% du fonds SMEA	Répartir le fonds SMEA dans les missions de suivi des activités de l'eau et de l'assainissement.	Matérialisation par un acte communal	Nombre de communes ayant pris l'acte			DRHA			
	Affectation de 25 % de fonds de gestion des édicules publics	Participer à l'élaboration de modèle de contrat de gestion des édicules publics	Elaboration d'un plan de gestion des édicules publics	XX Montant mobilisé			DRHA	2 019	PM	A rechercher
	Sous Total Mobilisation des ressources									65 000 000
Total plan d'actions niveaux régionaux								37 237 000 000		
